


Gerenciamento de Entregas

 **Aqui voce encontra**
Processo de gerenciamento de entregas, ou sprints do projeto

Ciclo de Vida

 **Atencao**
Atualizar ciclo de vida, para considerar o intervalo de tempo "a faturar" entre o "encerrado" e "faturado", visando melhor controle financeiro.

Abaixo o ciclo de vida para gerenciamento de sprints.

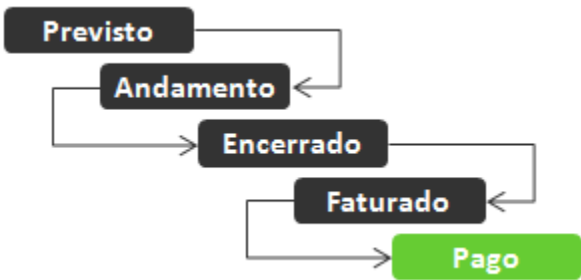

Sendo:

Estado	Descricao
Previsto	A entrega ja foi prevista no projeto, sendo, de alguma forma, definida. Nao precisa estar detalhada em por menores, uma vez que isso sera feito na reuniao de planejamento
Andamento	A entrega esta sendo produzida pelo time. Cada artefato dentro da entrega passa por seu fluxo especifico, e nisso vai gerando valor agregado ao cliente.
Encerrado	Seja com sucesso ou nao, a entrega foi finalizada. Todos artefatos dentro dela precisam estar ou entregues, ou cancelados. Uma entrega encerrada nao pode ser mais reaberta e nenhuma atividade pode ser mais desenvolvida nela.
Faturado	A entrega foi enviada para o financeiro, para ser faturada. O gerente de projetos monitora esse processo externo ao desenvolvimento do projeto.
Pago	A entrega foi paga pelo patrocinador. Nesse momento, ela entra para o arquivo morto do projeto, fazendo parte de seu historico

Nomenclatura

O 3PUP emprega a seguinte padronizacao nos nomes das entregas:

Padrao	Exemplo	Descricao
xxx - Qn	mizura - Q1	Entrega quinzenal, sem faturamento associado.
xxx - QFn	wessales - QF4	Entrega quinzenal, com faturamento associado.
xxx - En	wonder - modulo clientes - E7	Entrega com tempo variavel, sem faturamento associado.
xxx - EFn	EF2	Entrega com tempo variavel, com faturamento associado

Comentarios

Sob outra otica, quando uma entrega finaliza com o sufixo Q, significa que estamos falando de sprints de tamanho fixo, a la Scrum. Esta eh a forma ideal para controlar o projeto, pois timeframes fixos facilitam o controle de velocidade e planejamento.

Ja entregas com o sufixo E denotam sprints com data de entrega variavel, ou seja, eles nao possuem um timeframe fixo, sendo definidos em funcao de outras necessidades do projeto.

Quanto a numeracao n associada a entrega (como xpto - Q4 ou ypto - EF7), ela indica o numero da entrega do projeto, iniciando em 1 e sendo incrementada em uma unidade a cada entrega.

Finalmente, o xxx nada mais eh do que um texto livre associadão a entrega, indicando um resumo que seja claro para equipe/envolvidos do projeto. Eh opcional. Exemplos: TMINI-38 - SW - corrido - Q9 e Homologacao - EF2.

Processos

TODO
